«Løypemelding»

om prosjektet

Rauma Turnarena

ALT-konferansen 2026

Holmemstranda IL


Lager
23 kvm
Basishall 25 m x 23 m
Teknisk
Eksisterende gymsal 20 m x 10 m
10 m
25 m
3 m
20 m
Total lengde: 25 m + 3 m + 20
m = 48 meter


Rauma Turnarena



Holmemstranda IL Turn

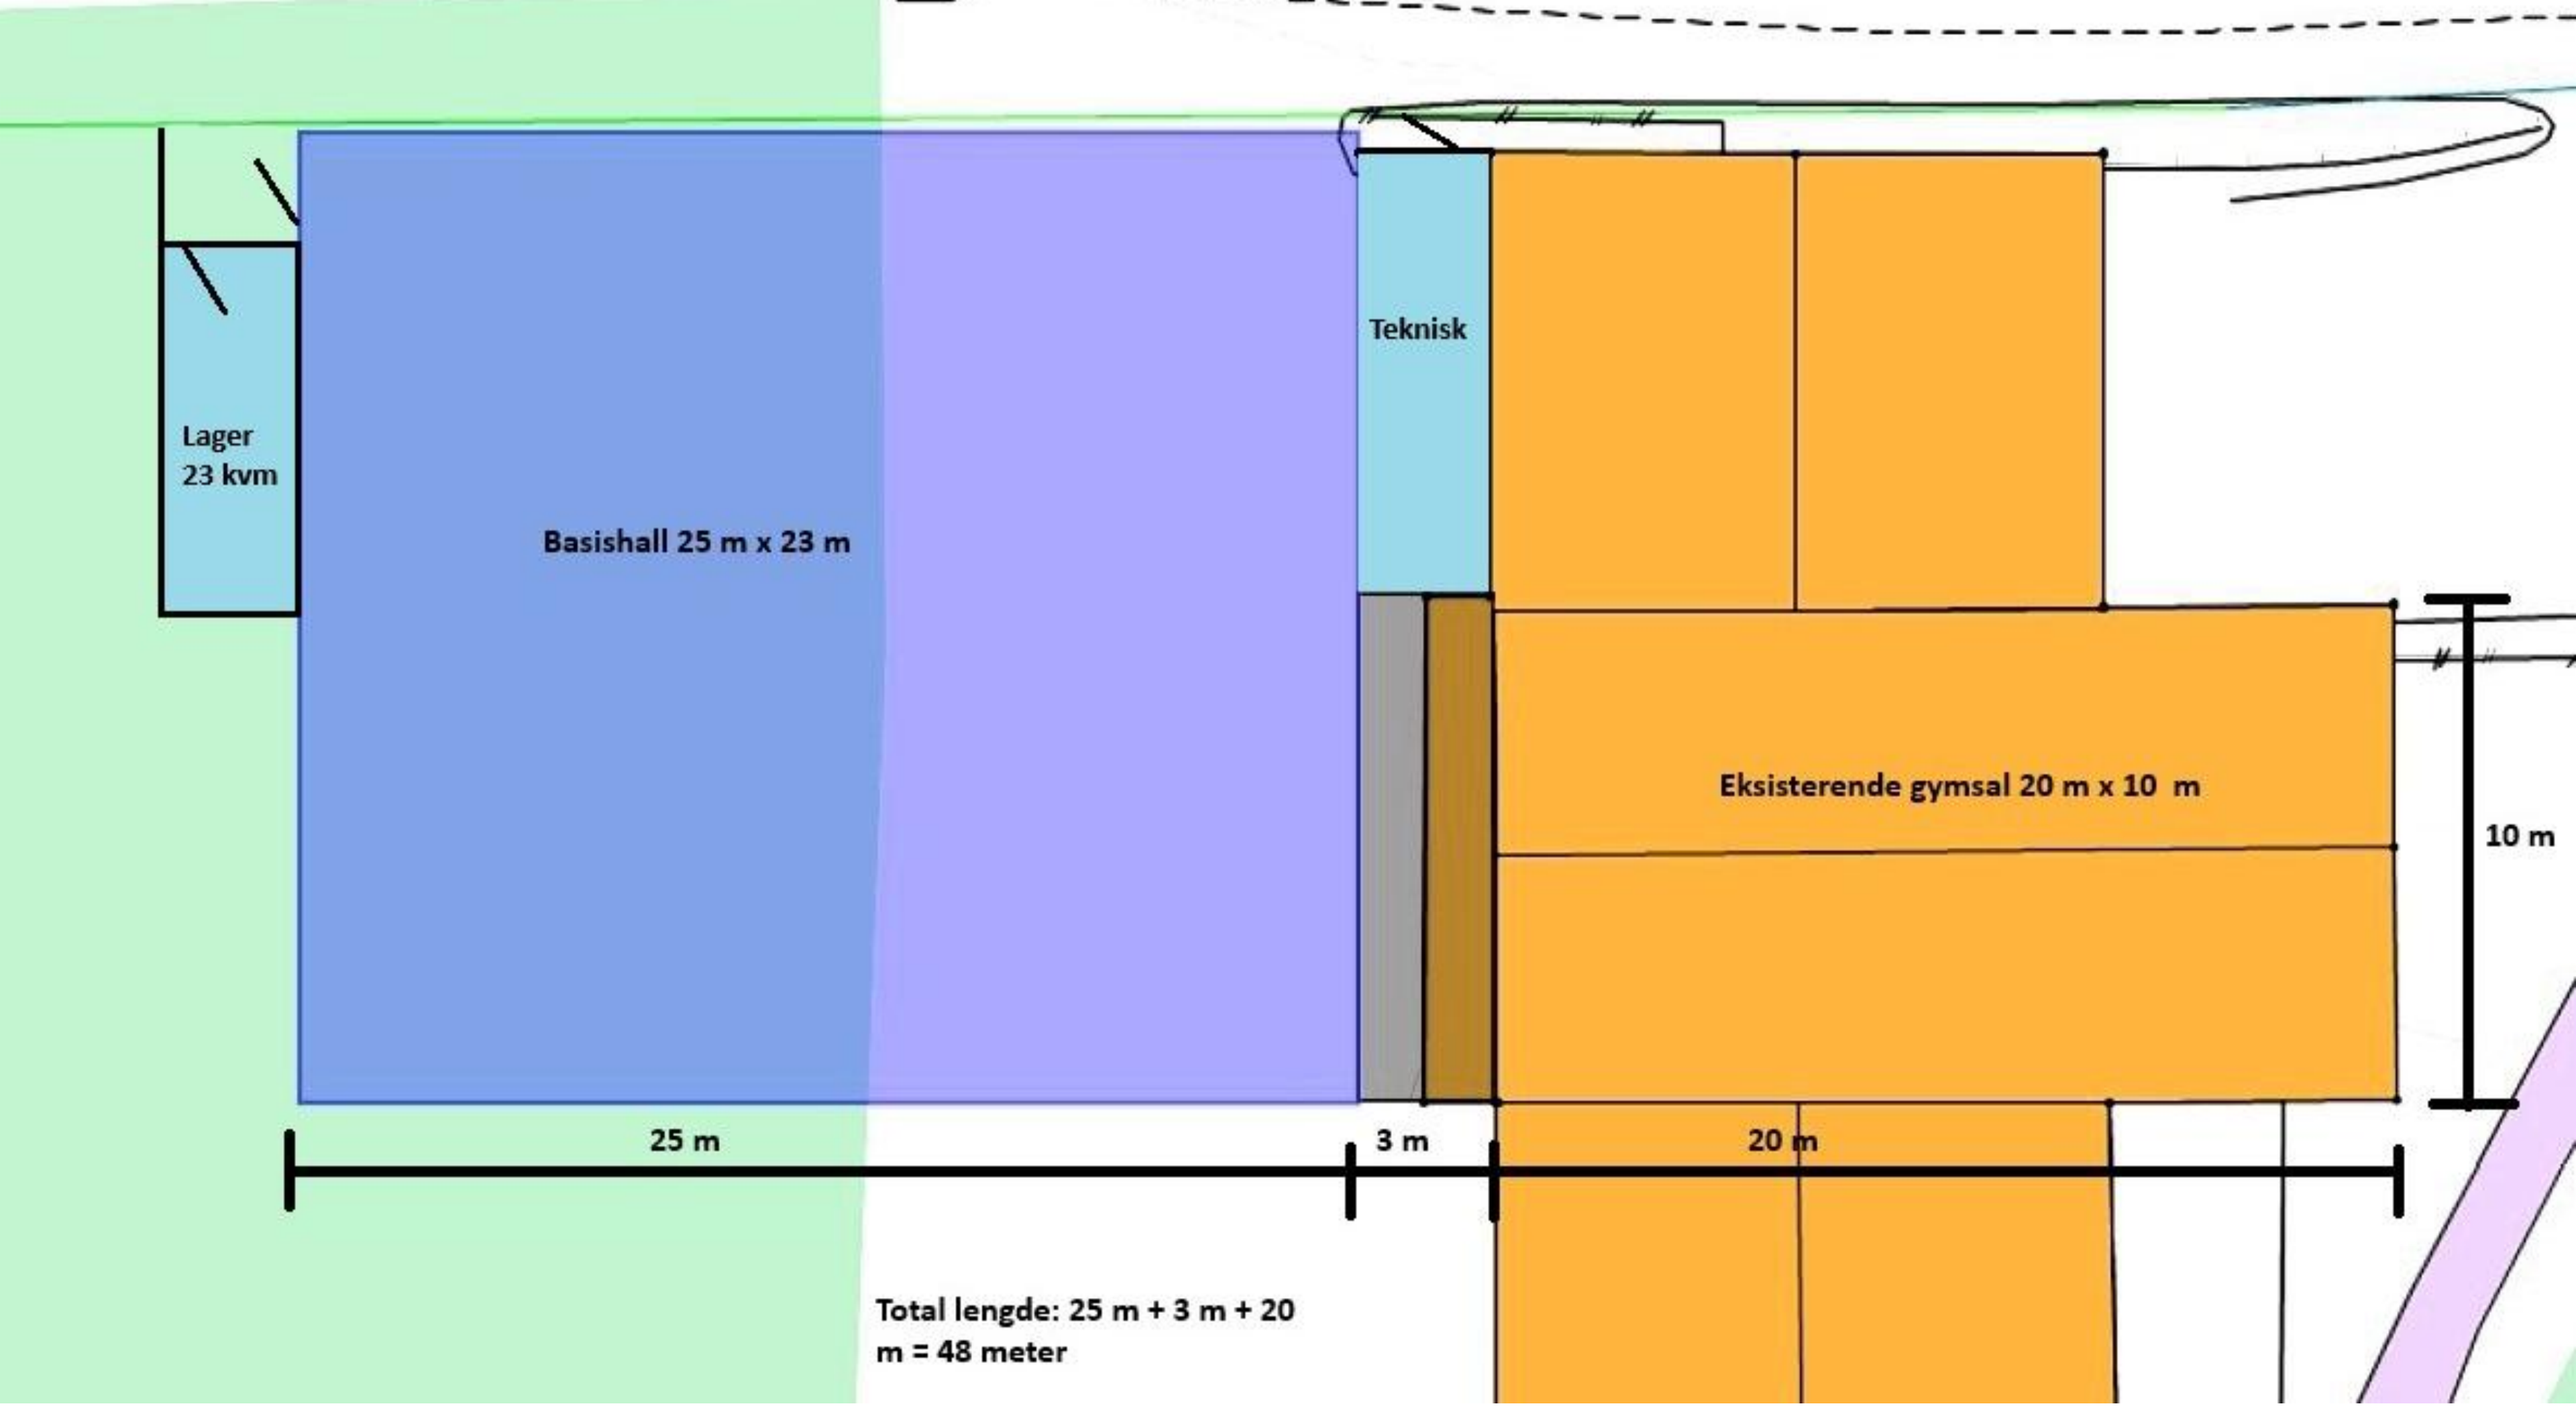

- Bredde og troppsgymnastikk
- Startet 2019 med 30 turnere
- Vokst hvert år

- I dag har vi 145 turnere
- Ca 40 trenere (Voksne og ungdomstrenere)
- Trener i 2 gymsaler og har sprengt kapasitet
- Leier Molde turnhall hver 14. dag

Fra dette...




Til dette!



Prosjektplan

ID	Milepæl	Måldato	Status
1	Oppstart konseptfase	01.09.24	Ferdigstilt
2	Konseptfase godkjent i Holmemstranda IL Styret	07.11.24	Ferdigstilt
3	Årsmøtevedtak for igangsetting av prosjektet	27.11.24	Ferdigstilt
4	Oppretting av prosjektgruppe utnevnt av Styret i HIL	20.12.24	Ferdigstilt
5	Intensjonsavtaler og søknad om tippemidler	15.01.25	Ferdigstilt
6	Finansieringsarbeid	01.11.25	Under arbeid
7	Beslutningspunkt gjennomføring	19.09.25	Ferdigstilt
8	Oppstart tilbudsinnhenting	01.10.25	Ferdigstilt
9	Byggesøknad	01.02.26	Godkjent
10	Kontraktsigneringer	01.02.26	Ferdigstilt
11	Byggestart	01.04.26	Vi er i gang!

Prosjektplan

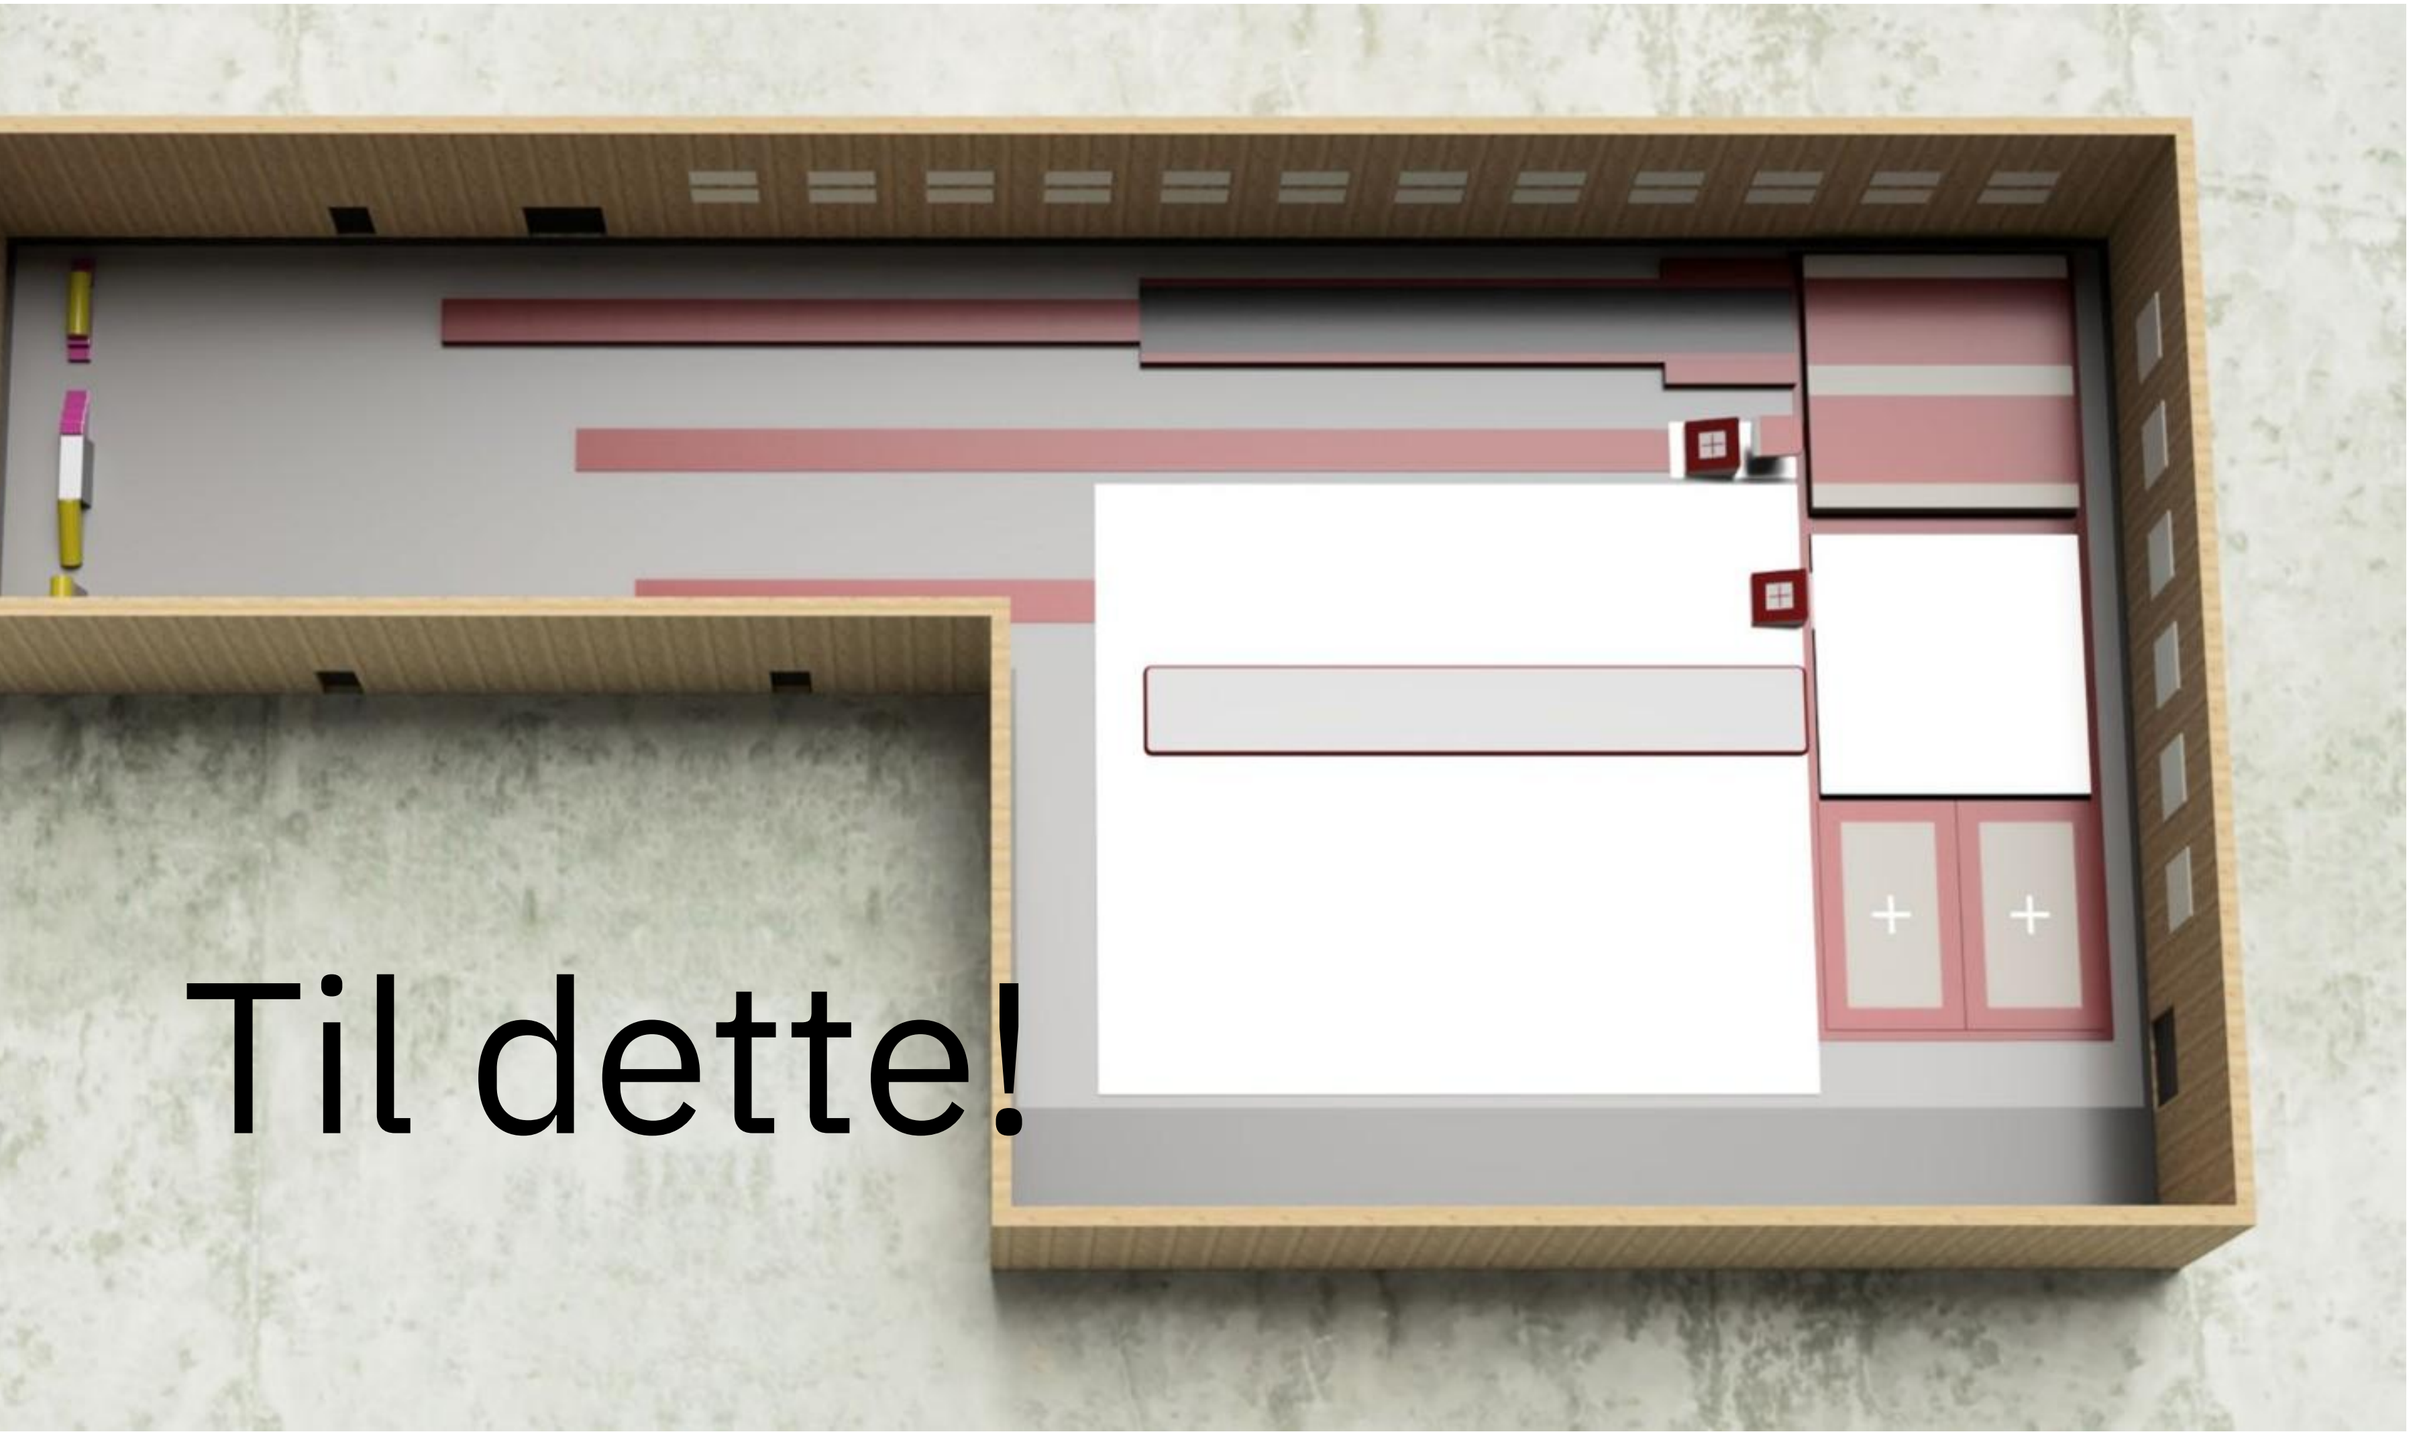ID	Milepæl	Måldato	Status
12	Grunnarbeid “grop”	01.09.26	Ferdigstilt
13	Betongarbeid “grop”	20.10.26	Ferdigstilt
14	Grunnarbeid nybygg	10.11.26	Under arbeid
15	Betongarbeid nybygg	20.11.26	Under arbeid
16	Stålkonstruksjon	01.12.26	Levering uke 46
17	Sandwichelement, m.m.	15.12.26	Levering uke 47
18	Støping av gulv	20.12.26	
19	Elektro nybygg	01.02.26	Planlagt
20	Ombygging lager	10.11.26	Under arbeid
21	Ventilasjonsanlegg	15.02.27	Bestilt
22	Varmeanlegg	15.02.27	Bestilt
23	Montering turnutstyr	01.03.27	Bestilt
24	Åpning av Rauma turnarena	11.03.27	




KOMATSU
PC120

Finansiering

	Kostnader	finansiering
Basishall (Hentet fra kostnadsestimat)	kr 14 753 378	
Tippemidler 1/3 av kostnad av turnhall		kr 4 917 793
Momskomp (Låneopptak)		kr 2 950 676
Rauma kommune		kr 2 500 000
Allerede eksisterende støtte næringsliv, fond og banker		kr 3 898 000
		kr 14 266 468
Manglende finansiering		**kr 486 910**

Sponsornivå

Salto

200 – 500 000 kr

- Logo og bilde på sponsorvegg i hallen, ca str 250 x 150 cm
- Logo på nettside

Flikkflakk

100 – 199 000 kr

- Logo på sponsorvegg i hallen, ca str 150 x 100 cm.
- Logo på nettside

Rulle

10 – 99 000 kr

- Logo på felles plakat i hallen
- Logo på nettside

Kommer: Kjøp skumklosser til skumgropa vår – få navnet ditt på felles plakat



vipps

Rauma Turn Arena

#626908

Vi bygger plass til mer turnglede. Blir du med?

Den nye turnhallen i Rauma er under bygging. Hjelp oss å få finansieringen i mål ved å kjøpe en eller flere skumklosser til skumgropa vår.

1 kloss = 1 000 kr

Turnhallen er under bygging – nå trenger vi deg med på siste innspurt!

Vi bygger et sted der barn og unge i Rauma kan møtes, lære nye triks, heie på hverandre og kjenne at de får det til. Nå inviterer vi til en felles dugnad for å få finansieringen i mål.

Vi skal fylle skumbassenget med skumklosser, og du kan bli symbolsk eier av en eller flere klosser. Du kan bidra selv, sammen med familien eller som bedrift, og får navnet ditt/deres på en felles plakett i hallen.

Vipps til 626908, og skriv ønsket navn til plaketten i meldingen. Én kloss koster 1 000 kr – du kan gjerne kjøpe flere!

Spørsmål?

https://www.holmemstrandail.no/raumaturnarena

https://www.facebook.com/holmemstrandail

Prosjektleder: Anders Alfarnes
anders@alfarnes.com
95 47 35 02
